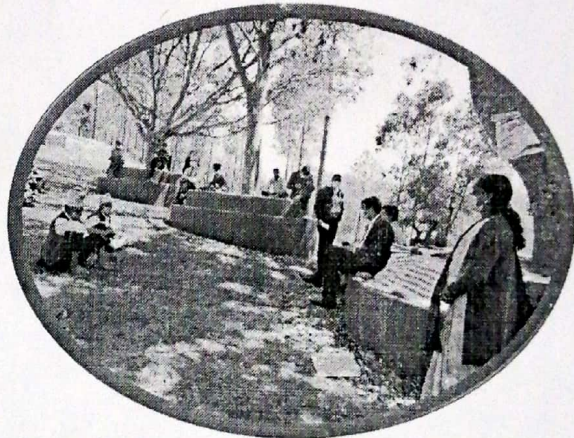




छत्रदेव गाँउपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
छत्रगंज-अर्घाखाँची

आ.व २०७७/७८ मा संचालित योजनाहरुको सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन










योजना शाखा

आज मिति २०७८ साल असार २० गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ४ मा सञ्चालित आकाशे पानी संकलन गर्न छैटा निर्माण योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी र उपभोक्ताहरुको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो ।




वजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
१५,००,०००।००	प्रदेश विशेष अनुदान	१६,१६,६८०।९२	१,६१,६८०।५७	२०७७/१२/१३	२०७८/०३/२५

तपशिल

रोहबर प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री अशोक कुमार श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
५.	श्री सुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
६.	श्री पार्वती पाण्डे	सव-ईन्जिनियर	
७.	श्री हरि प्रसाद खनाल	खा.पा.स.टे	_____
८.	श्री भाष्कर आचार्य	वडा सचिव	_____
९.	श्री शाल्वा श्रेष्ठ	सव-ईन्जिनियर	
१०.			
११.			

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१	नरेन्द्र वहादुर मल्ल	छत्रदेव-४	
२	डिल्लीराज भुसाल	"	
३	तुल्सी राम खनाल	"	

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
४	लंजय पाण्डे	बिचिये	
५	रिता टक्काल	कोल्हापुरा	
६	रिता अमिता केडेल (वगम)	लफाच	
७	धान कडाडु (डाधिकारी)	"	
८	विमला पुचा मगर	"	
९	शोभा टक्काल	राजगमले पोखरी	
१०	नुमातल अलाल	लफाच	
११	जमुना टक्काल	"	
१२	तुलसीदास पाण्डे	खोडेवडा	
१३	भीमलाल मुसाल	"	
१४	रवीम प्रसाद मुसाल रवीम		
१५	अधिराज मुसाल	"	
१६	बाबु राम मुसाल	भुवतडा	
१७	श्याम प मुसाल	भोलीपोखरी	
१८	होपलाल मुसाल	भुवतडा	
१९	शिव मुसाल	दाख्यारी	
२०	पवन पाण्डे	लफाच	
२१	विक्रम पाण्डे	"	
२२	दिपेन्द्र शोपाने	"	
२३	मनोज पाण्डे	"	
२४	राज पाण्डे	"	
२५	प्रतीक्षा मुसाल	भुवतडा	
२६	माधवदेवी मुसाल	भुवतडा	
२७	मया पुना	दाख्यारी	
२८	विमला मुसाल पुलाभी	दाख्यारी	विमला
२९	विमला थापा	पेयापाह	विमला राखीदी मगर

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
३०	सरिता भुसाल	भुवनेश्वर	Sarita
३१	पावता पांडे	भुवनेश्वर	पावता
३२	नेत्रमण्डल पन्नी	झापा	नेत्रमण्डल
३३	पारसीका पांडे	" "	पारसीका पांडे
३४	गणेश आर्या	"	गणेश
३५	राम प्रसाद पाण्डे		राम
३६			
३७			
३८			
३९			
४०			
४१			
४२			
४३			
४४			
४५			
४६			
४७			
४८			
४९			
५०			
५१			
५२			
५३			
५४			
५५			

प्रस्तावहरू

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को प्रदेश विशेष अनुदान कार्यक्रमद्वारा विनियोजित रकम वडा नं. ४ मा सञ्चालित आकाशे पानी संकलन गर्न घैटा निर्माण को प्राविधिक लागत ईष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निकासी दिनका लागि छत्रदेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपशिल









आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकावाट	१५,००,०००।००	विल	७६२९३३।५६
कन्टिन्जेन्सी	४५,०००।००	डोर हाजिरि फारम	४६२२०
उपभोक्ता श्रमदान	९६२३८३।०६	भरपाई	२६९०००।-
जम्मा	१६९०३८३।०६	अन्य	
		जम्मा	९६९०३८३।०६

आज मिति २०७८ साल असार २० गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ३ मा सञ्चालित मथुरा सहिद स्मृति पार्क तथा खेलमैदान वडा नं. ३ योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी र उपभोक्ताहरुको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो ।





बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्प्रीता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
१०,००,०००।००	प्रदेश सशर्त	१०,८३,८३८।७३	१,१३,८२८।६२	२०७७/१२/३०	२०७८/०३/१५

तपशिल

रोहबर प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री तेज प्रसाद खनाल	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
५.	श्री सुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
६.	श्री हरि प्रसाद खनाल	खा.पा.स.टे	
७.	श्री तुल्सा खनाल	वडा सचिव	
८.	श्री दुर्गा पन्थी	कार्यालय सहायक	
९.			
१०.			

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१.	हुमा जि. सी.		
२.	हस्वरी पाण्डे		
३.	रवीमानन्द पाण्डे		
४.	रामलाल पाण्डे		

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
५	युवराज पाने	३	Subramanyam
६	रमेश रवनाल	३	Reddy. Khera
७	वल वहादुर बिं का	"	Reddy
८	विन्दु गुसाण	"	Bina
९	लिलाकला रवनाल	"	लीला रवनाल
१०	कमला पाने	"	Kamla
११	मानकुमारी बि. का.	"	मान
१२	भापेलाल पाने (अधर)	"	भापेलाल
१३	भैरवनाथन पाने (उपस्थ)	"	भैरवनाथन
१४	दीपलाल पाने (समीप)	"	दीपलाल
१५	गीता काफले (कौशस्थ)	"	गीता
१६	जगुना रवनाल (सदर)	"	जगुना
१७	सरसाणि पाने	"	सरसाणि
१८	रफीका रवनाल	"	रफीका
१९	जगुना रवनाल रव.	"	जगुना
२०	दावश्याम रवनाल	"	दाव
२१			
२२			
२३			
२४			
२५			
२६			
२७			
२८			
२९			
३०			

प्रस्तावहरू

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को प्रदेश सशर्त द्वारा विनियोजित रकम वडा नं. ३ मा सञ्चालित मथुरा सहिद स्मृति पार्क तथा खेलमैदान वडा नं. ३ को प्राविधिक लागत ईष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निकासी दिनका लागि छत्रदेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।









तपशिल

आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकाबाट	१०,००,०००।००	विल	८९९२७।७
कन्टेन्जेन्सि	३०,०००।००	डोर हाजिरि फारम	९६०४००।-
उपभोक्ता श्रमदान	९२४८००।६९	भरपाई	९९४२४०।-
जम्मा	९०४४८००।६९	अन्य	
		जम्मा	९०४४८००।६९




आज मिति २०७८ साल आषाढ २० गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ६ मा सञ्चालित घाटखोला खेलमैदान वडा नं. ६, निर्माण योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी र उपभोक्ताहरूको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो।

बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
१०,००,०००।००	प्रदेश शशर्त बजेट	१०,८०,५९३।२५	१,१०,५९३।२५	२०७७/१२/२५	२०७८/०३/२५

रोहबर प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री कमल पौडेल	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री साजन पाण्डे	इन्जिनियर	
५.	श्री मुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
६.	श्री मणिराम विश्वकर्मा	वडा सचिव	
७.	श्री शंकर रिजाल	सव-इन्जिनियर	
८.	श्री शारदा बज्जाडे	सामाजिक परिचालक	
९.	श्री साजन पाण्डे	इन्जिनियर	
१०.	श्री मुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१	टंकनाथ पन्थी (अध्यक्ष)	छत्रदेव-६	
२	सुरज अधिकारी	"	
३	मिना थापा (कोषाध्यक्ष)	"	मिना थापा
४	नारान प्रसाद पाण्डे (सदस्य)	"	
५	देवकला अधिकारी (सदस्य)	"	देवकला
६	प्रेमनाथ पाण्डे (संयोजक)	"	प्रेमनाथ
७	यम बहादुर अधिकारी	"	

क्र.सं.	नाम धर	पेगाना	हस्ताक्षर
१	विश्वमित्री पाण्डे	इन्चार्ज-६	विश्वमित्री
२	कसूराम पाण्डे	"	Kamr
३	अमृत पाण्डे	"	Amr
४	रमेश पाण्डे	"	Ram
५	हाजर बाबा	"	Ha
६	मनिराम पाण्डे	"	Mn
७	कुविराज पाण्डे	"	Ku
८	रुमात्रल पाण्डे	"	Ru
९	विष्णु पाण्डे	"	Vis
१०	धर्मराज अधिकारी	"	Dharm
११	लक्ष्मण पाण्डे	"	Lax
१२	अरुण पाण्डे	"	Aru
१३	दिपक पाण्डे	"	Di
१४	श्रीमन्त शर्मा	"	Shri
१५	गुनाकर शर्मा	"	Guna
१६	प्रेमराज अधिकारी	"	Prem
१७	दुर्गा अधिकारी	"	Durga
१८	विष्णु अधिकारी	"	Vish
१९	अविश्व पाण्डे	"	Avi
२०	विष्णु मंडाई	"	Vish
२१	कृष्ण पाण्डे	"	Kr
२२	युगल कर्जाई	"	Yug
२३	विष्णु कर्जाई	"	Vish
२४	अनिल कर्जाई	"	Ani
२५	विष्णु अधिकारी	"	Vish
२६	लक्ष्मी अधिकारी	"	Lax

प्रस्तावहरू

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रमद्वारा वडा नं. ६ मा सञ्चालित घाटखोला खेलमैदान वडा नं. ६, निर्माण योजनाको को प्राविधिक लागत ईष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निकासी दिनका लागि छत्रदेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपशिल








आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकाबाट	१०,००,०००।००	विल	३,३९,३६६।८०
कन्टेन्जेन्सि	३०,०००।००	डोर हाजिरि फारम	३,०३,०००।-
वपभोक्ता श्रमदान	८५,६६६।८०	भरपाई	४,५९,३००।-
जम्मा	१०,८५,६६६।८०	अन्य	
		जम्मा	१०,८५,६६६।८०

आज मिति २०७८ साल असार १९ गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ३ मा सञ्चालित डाँडा पोखरादेखी वैङ्दी घाली मोटरबाटो सुधार विस्तार योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी र उपभोक्ताहरूको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो ।



बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
४,००,०००।००	प्रदेश सशर्त	४,३१,१९०।२४	४३,१९०।६२	२०७८/०१/२३	२०७८/०३/२५

तपशिल

रोहबर प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री तेज प्रसाद खनाल	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री साजन पाण्डे	इन्जिनियर	
५.	श्री सुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
६.	श्री हरि प्रसाद खनाल	खा.पा.स.टे	
७.	श्री तुल्सा खनाल	वडा सचिव	
८.	श्री दुर्गा पन्थी	कार्यालय सहायक	— Absent —
९.	श्री लक्ष्मण पन्थी	वडा सचिव	
१०.	श्री रामराज पन्थी	ह.स.चा	

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१.	श्री चन्द्र ब. पन्थी (अध्यक्ष)	छत्रदेव	
२.	श्री राम ब. पन्थी (सचिव)		
३.	श्री राम ब. पन्थी (सचिव)	राम	
४.	श्री मोती ब. पन्थी		मो. मो. ८५८

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
५	श्री लक्ष्मण व. पन्थी	हजरे - २	
६	श्री भाति व. पाण्डे	"	
७	श्री पुष्कराज पाण्डे (सिंथोबा)		पुष्कराज पाण्डे
८	श्री लेखनाथ वन्जाडे	वडोहरा	
९	श्री लेखनाथ		
१०	नरेश पाण्डे		
११	रविम वेडाड		रविम वेडाड
१२	राम पाण्डे		
१३			
१४	रामनाथ कटारोडे		
१५	श्रीधराज पाण्डे		
१६	दिमलाल पन्थी		
१७	मोदरा पाण्डे	हजरे	
१८	मवि लाल (वनाल)	मवी लाल खनाल	
१९	राम म खनाल		
२०			
२१			
२२			
२३			
२४			
२५			
२६			
२७			
२८			
२९			
३०			

प्रस्तावहरू

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को गाउँसभा द्वारा विनियोजित रकम वडा नं. ३ मा सञ्चालित डाँडा पोखरादेखी बैङ्दी पाली मोटरबाटो सुधार विस्तार को प्राविधिक लागत ईष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निकासी दिनका लागि छत्रदेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।







तपशिल

आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकावाट	४,००,०००।००	विल	३३७९५३
कन्टेन्जेन्सि	१२,०००।००	डोर हाजिरि फारम	९९९०००।-
उपभोक्ता श्रमदान	६०९५३।-	भरपाई	
जम्मा	४४८९५३	अन्य	
		जम्मा	४४८९५३



आज मिति २०७८ साल असार १८ गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. १ मा सञ्चालित तल्लो वड्डाडा खा.पा तथा डाडाबाझ मो.वा छत्रदेव-१ योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी र उपभोक्ताहरुको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो ।

बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
५,००,०००।००	स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	५,३९,१७३।६५	५४,१७३।६५	२०७७/११/२५	२०७८/०३/२५

रोहवर प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री प्रकाश राज पन्थी	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री भरतमणि गिरी	वडा सदस्य	
५.	श्री साजन पाण्डे	इन्जिनियर	
६.	श्री सुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
७.	श्री नारायण ज्ञवाली	वडा सचिव	
८.	श्री किरण तामाङ	अ.सव-इन्जिनियर	
९.	श्री तारा वि.क	कार्यालय सहायक	
१०.	श्री राधा मुखिया	डा.पा. सदस्य	राधा
११.	श्री साधुमाथ डे.स	लेख. सहायक	

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१	विमोद कुमाल	छत्रदेव-१	
२	श्रीमान कुमाल	" - १	श्रीमान
३	अनिल कुमाल	" - १	
४	हेडराज कुमाल	" - १	हेडराज कुमाल
५	तुल्सा कुमाल	" - १	तुल्सा

क्र.सं.	नाम थर	दफ्तार	हस्ताक्षर
	अतिर वहादुर कुमाल	छाउदेव-१	अतिर वहादुर
	चिरन्गीनी कुमाल	छाउदेव-१	
	रमा कुमाल	छाउदेव-१	रमा
	रविश वहादुर कुमाल	छाउदेव-१	
	मोती वहादुर कुमाल	छाउदेव-१	मोती वहादुर
	हरि वहादुर कुमाल	छाउदेव-१	हरि हरि व. कुमाल
	मान सिंह कुमाल	छाउदेव-१	मान सिंह
	इश्वरी कुमाल	छाउदेव-१	इश्वरी कुमाल
	रमेश कुमाल	छाउदेव-१	रमेश कुमाल
	आरडा कुमाल	छाउदेव-१	जानक
	मिना कुमाल	छाउदेव-१	मिना
	मनकुला कुमाल	छाउदेव-१	मनकुला
	कौशिकी कुमाल	छाउदेव-१	कौशिकी
	त्रिम वहादुर कुमाल	छाउदेव-१	त्रिम वहादुर
	माधव कुमाल	छाउदेव-१	माधव
	सुमित्रा कुमाल	छाउदेव-१	सुमित्रा
	हिम कुमारी कुमाल	छाउदेव-१	हिमकुमारी
	सारदा कुमाल	छाउदेव-१	सारदा
	भोक्ता कुमाल	छाउदेव-१	भोक्ता
	मान वहादुर कुमाल	छाउदेव-१	मान वहादुर
	हुम वहादुर कुमाल	छाउदेव-१	
	केशव कुमाल	छाउदेव-१	केशव
	रूपिराम कुमाल	छाउदेव-१	रूपिराम
	अनन्त वहादुर कुमाल	छाउदेव-१	अनन्त वहादुर कुमाल
	बसन्ती कुमाल	छाउदेव-१	बसन्ती
	सिता कुमाल	छाउदेव-१	सिता

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम द्वारा विनियोजित रकम वडा नं. १ मा सञ्चालित तल्लो वड्डाडा खा.पा तथा डाडाबाझ मो.वा छत्रदेव-१ को प्राविधिक लागत ईष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निकासी दिनका लागि छत्रदेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपशिल












आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकाबाट	५,००,०००।००	विल	२६४९०२।८
कन्टेन्जेन्सि	१५,०००।००	डोर हाजिरि फारम	१२९०००।-
उपभोक्ता श्रमदान	४४९०२।८	भरपाई	१४९२००।-
जम्मा	५४४९०२।८	अन्य	
		जम्मा	४४४९०२।८

आज मिति २०७८ साल असार १८ गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ८ मा सम्बालित ८ नं. वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा संभार योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र उपभोक्ताहरुको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो।





बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
५,५०,०००।००	वार्षिक विकास	५,९६,७९९।५६	६३,२९९।५६	२०७७/०९/०७	२०७८/०३/३०

तपशिल

रोहवर प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भण्डीराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री राजकुमार श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री शारदा खनाल	कार्यपालिका सदस्य	
५.	श्री सुनिल पन्थी	योजना प्रमुख	
६.	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
७.	श्री सागर चौधरी	अ.सब.ईन्जिनियर	
८.	श्री पुष्पराज भण्डारी	वडा सचिव	
९.	श्री दुर्गा सुता	वडा सदस्य	
१०.	श्री बाबुराज महर्षि	ह.व.स.स	
११.	श्री रानि व. पाण्डे	वडा सदस्य	

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१.	प्रकाश वि.क	छत्रदेव ८	
२.	रौद्राज वि.क	"	
३.	रामू श्रेष्ठ	"	
४.	रविज पौडेल	"	

क्र.सं.	नाम धरा	ठेकावा	हस्ताक्षर
१	रामू चौडेल		रामू चौडेल
२	रमा वि.क		रमा
३	सिधना वि.क		सिधना
४	बनू चौडेल		बनू
५	सिता चौडेल		सिता
६	गुला चौडेल		गुला
७	चौधरी चौडेल		चौधरी
८	द. विनायक गुला	द. विनायक - ८	द. विनायक
९	मुमलाल चौडेल	११ - ८	मुमलाल
१०	करना चौडेल	११ ११	करना
११	विश्वना चौडेल	११ १२	विश्वना
१२	मुकलाल चौडेल		मुकलाल
१३	पद्मपति गुरासीनी		पद्मपति
१४	दुभा चौडेल		दुभा
१५			
१६			
१७			
१८			
१९			
२०			
२१			
२२			
२३			
२४			
२५			
२६			
२७			
२८			
२९			
३०			

प्रस्तावहरू

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को गाउँसभा द्वारा विनियोजित रकम वडा नं. ८ मा सञ्चालित ८ नं. वडा कार्यालय भवन मर्मत तथा संभार योजना को प्राविधिक लागत ईष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निकासी दिनका लागि छत्रदेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।











तपशिल







आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकाबाट	५,५०,०००।००	विल	३४२९९२।५
कन्टेन्जेन्सि	१६,५००।००	डोर हाजिरि फारम	२०७६५०
उपभोक्ता श्रमदान	६६५००।५	भरपाई	४६६३८
जम्मा	६०००००।०५	अन्य	
		जम्मा	६०००००।०५

आज मिति २०७८ साल जेष्ठ २३ गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. २ मा सञ्चालित वि पि स्मृति भवन योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुलसीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी र उपभोक्ताहरूको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो ।

बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
४,००,०००।००	वार्षिक विकास	४,३४,७०६।००	४३,१११।११	२०७७/०९/०६	२०७८/०२/३०

रोहबर प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुलसीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री राजेश कुमार पन्थी	अध्यक्ष	
४.	श्री कमला अधिकारी	कार्यपालिका सदस्य	
५.	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६.	श्री सुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
७.	श्री बिशाल ओली	वडा सचिव	
८.	श्री सानुमाया के.सी	लेखा सहायक	
९.	श्री बाबुराम बस्नेत	ह. स. च. वि.	
१०.	विशेष उपस्थिति, छत्रदेव गाउँपालिका, अध्यक्ष श्री नारायण पौडेल	उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधी	






क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१	कमल श्रेष्ठ	छत्रदेव १	
२	प्राप्ता पौडेल	छत्रदेव २	
३	सुर्जा पौडेल	१)	
४	भावना थापा	"	
५	कल्पिता मिश्रा	२	
६	रेखा र. सुनार	" २	
७	नारायण पौडेल पाण्डे	२	
८	पिताम्बर श्रेष्ठ	२	

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१	नरेश रायभाभी	हरेद्वार - २	नरेश
२	प्रेम रायभाभी	॥	Prem
३	सुमन खन्ना	॥	Suman
४	ललित राय	॥	Lalit
५	पसुपति पाण्डे	॥	Pasupati
६			
७			
८			
९			
१०			
११			
१२			
१३			
१४			
१५			
१६			
१७			
१८			
१९			
२०			
२१			
२२			



आज मिति २०७८ साल जेष्ठ ०९ गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ६ मा सञ्चालित अस्टारी बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र उपभोक्ताहरूको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो।

बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
१०,००,०००।००	संघीय सशर्त विद्यालय भौतिक पूर्वाधार	१४,४४,६७२।७९	१,४४,६७२।७९	२०७७/०७/२३	२०७८/०९/३०

रोहबर प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री कमल पौडेल	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री ज्ञान प्रसाद पाण्डे	वडा सदस्य	Absent
५.	श्री खडानन्द पाण्डे	वडा सदस्य	Absent
६.	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	Absent
७.	श्री सुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
८.	श्री मणिराम विश्वकर्मा	वडा सचिव	
९.	श्री शंकर रिजाल	सब-ईन्जिनियर	
१०.	श्री शारदा बज्जाडे	सामाजिक परिचालक	
११.	श्री विश्वदेव न्यौपाने	हस्ताक्षर गर्ने स्वास्थ्य चौकी प्रमुख	

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१.	जगन्नाथ रेग्मी	छत्रदेव-६	
२.	मिना न्यौपाने (पाण्डे)	"	
३.	विमललाल पाण्डे	"	
४.	बिना पाण्डे	"	
५.	गिता पाण्डे	"	

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
६	डिलाराम बन्जाडे	दुधदेव-६	
७	इश्वरी स. रेग्मी	"	
८	मित्रलाल पाण्डे	"	
९	विमला बन्जाडे	"	
१०	दलकला बन्जाडे	"	
११	पवित्रा रेग्मी	"	पवित्रा रेग्मी
१२	डिला पाण्डे	"	डिला पाण्डे
१३	कृष्ण स. पाण्डे	"	कृष्ण पाण्डे
१४	रूपला कुमारी पाण्डे	"	रूपला
१५	तारादेवी पाण्डे	"	तारा देवी पाण्डे
१६	विम कुमारी पाण्डे	"	विम कुमारी पाण्डे
१७	राधा बन्जाडे	"	राधा
१८	सुरिल पाण्डे	"	
१९	शान्ता पाण्डे	"	शान्ता
२०	लालराम पाण्डे	"	लालराम पाण्डे
२१	दुर्गामणी पाण्डे	"	दुर्गामणी पाण्डे
२२			
२३			
२४			
२५			
२६			
२७			
२८			
२९			

प्रस्तावहरु

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा ।

निर्णयहरु

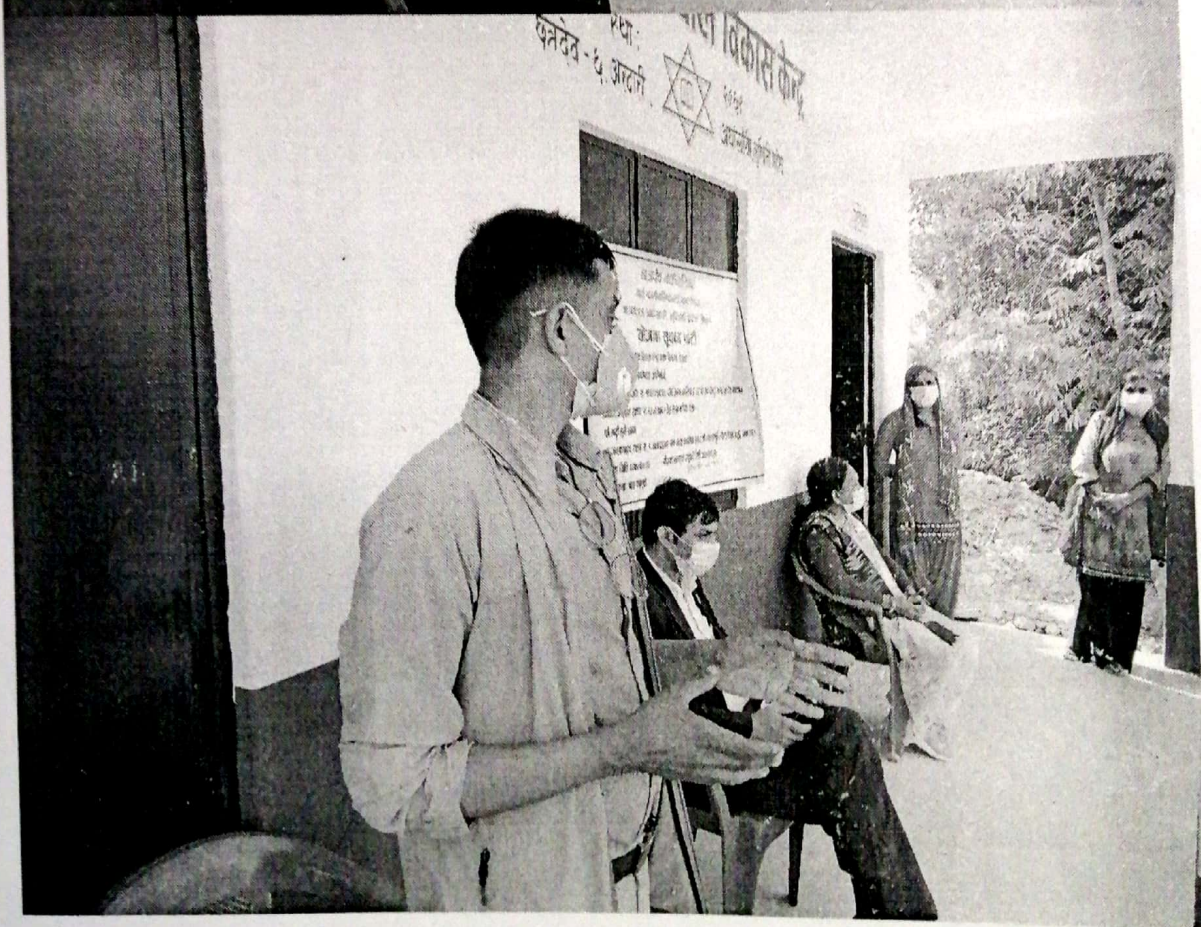
प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को संघीय सशर्त विद्यालय भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमद्वारा वडा नं.६ मा सञ्चालित अरटारी बाल विकास केन्द्र भवन निर्माण को प्राविधिक लागत ईष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निकासी दिनका लागि छत्रदेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपशिल

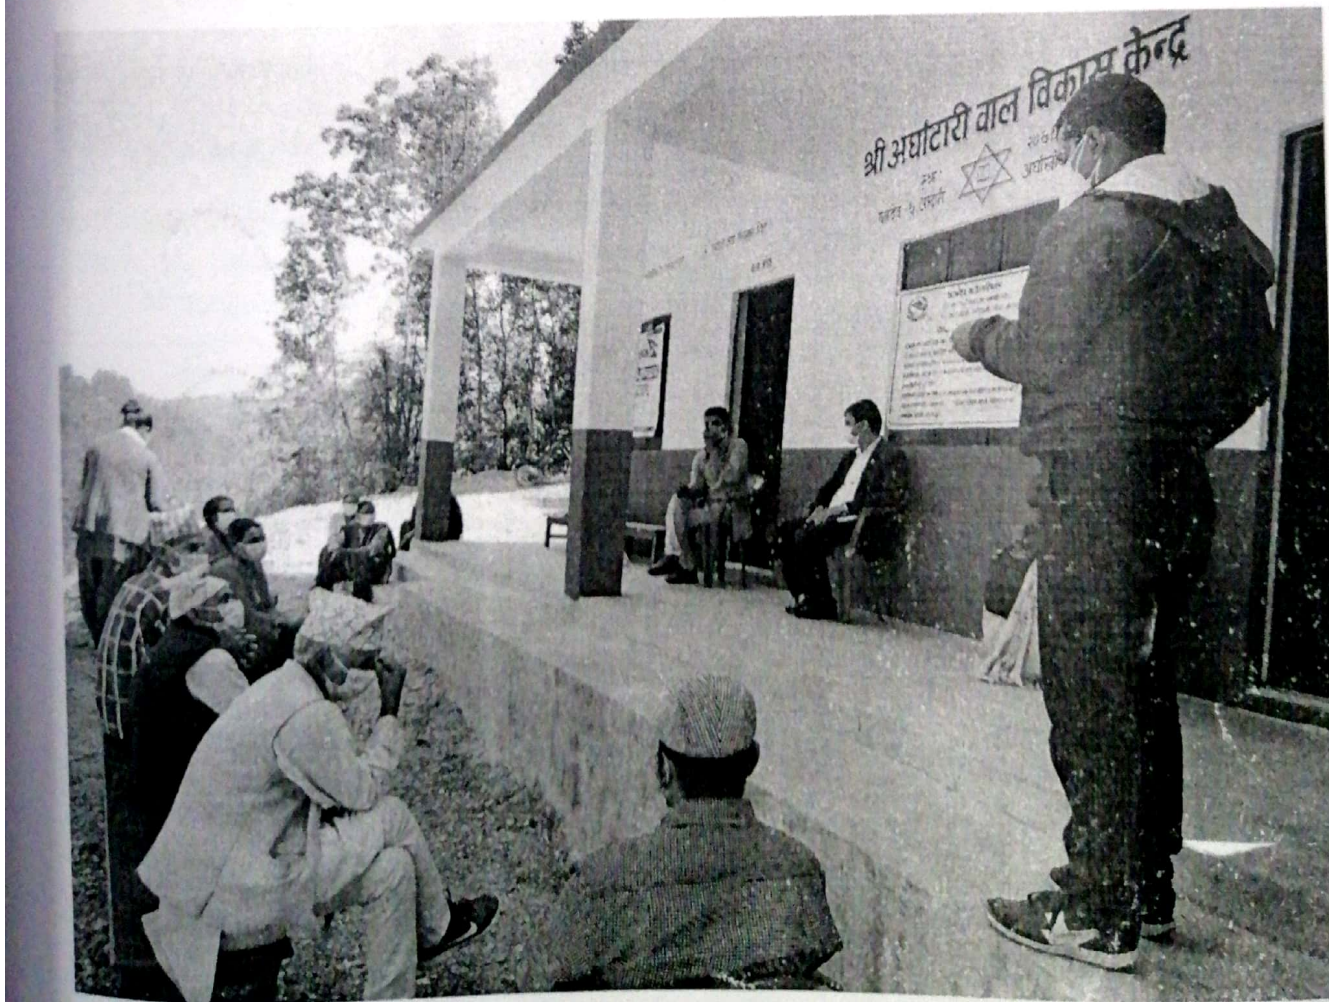
आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकाबाट	१३,००,०००।००	विल	२०६४०६।२९
उपभोक्ता श्रमदान	९४९२०६।२९	डोर हाजिरि फारम	४९६४००।-
अन्य	—	भरपाई	२४७४००।-
जम्मा	९४९२०६।२९	अन्य	—
		जम्मा	९४९२०६।२९

ल. ०६/१२/२०७७

अरटारी बाल बिकास केन्द्र भवन निर्माण सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रम










अरटारी बाल बिकास केन्द्र भवन निर्माण सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रम






आज मिति २०७८ साल जेष्ठ १२ गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ६ मा सञ्चालित म्यालनेटा वाल उद्यान, निर्माण योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी र उपभोक्ताहरूको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो ।

बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
१,५०,०००।००	वार्षिक विकास कार्यक्रम	१०,२३,९८०।८५	१,०२,४८०।८५	२०७७/०७/२७	२०७८/१२/३०

रोहबर प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री कमल पौडेल	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री ज्ञान प्रसाद पाण्डे	वडा सदस्य	Absent
५.	श्री खडानन्द पाण्डे	वडा सदस्य	Absent
६.	श्री साजन पाण्डे	इन्जिनियर	Absent
७.	श्री सुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
८.	श्री मणिराम विश्वकर्मा	वडा सचिव	
९.	श्री शंकर रिजाल	सब-इन्जिनियर	
१०.	श्री शारदा बज्जाडे	सामाजिक परिचालक	
११.	छत्रदेव-पाँचा	हजारौंछा (कायम चौकी प्रमुख)	

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१	राम बहादुर खना	हृषीकेश-६	
२	रविवन्द पाण्डे	"	
३	पार्वता पाण्डे	"	
४	प्रविण अरुण्डि पौडेल	"	
५	मतकला पाण्डे	"	

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
६	जगदिश्वर पाण्डे	दशरथ-६	
७	सुर्य प्रसाद पाण्डे	"	
८	शनिश्वर पाण्डे	"	
९	ज्ञानिराम पाण्डे	"	ज्ञानिराम पाण्डे
१०	कल्पना पाण्डे	"	कल्पना
११	मनिराम मुखिया	"	
१२	नेत्र प्रसाद पाण्डे	"	
१३	जगेश पन्थी	"	
१४	शिवराम पाण्डे	"	शिवराम
१५	गुलामी राम पाण्डे	"	गुलामी राम
१६	देवराज पाण्डे	"	देवराज पाण्डे
१७	मोतीलाल मुखिया	"	मोतीलाल
१८	विठ्ठल प्रसाद पाण्डे	"	विठ्ठल प्रसाद पाण्डे
१९	गिता पाण्डे	"	गिता पाण्डे
२०	नेत्र प्रसाद पन्थी	"	
२१	लक्ष्मण बज्रा	"	
२२	शनिश्वर पाण्डे	"	
२३	कृष्ण प्रसाद पाण्डे	"	
२४	जगदीश प्रसाद पाण्डे	"	
२५	विश्वदेव न्यायपाने	इन्चार्ज	
२६	चिन्ता बहादुर मुखिया		चिन्ता बहादुर
२७			
२८			
२९			

प्रस्तावित

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा ।

निर्णयित

प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रमद्वारा वडा नं.६ मा सञ्चालित म्यालमेटा बाल उद्यान, निर्माण योजनाको को प्राविधिक लागत ईष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निक्कासा दिनका लागि छत्रदेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपशिल

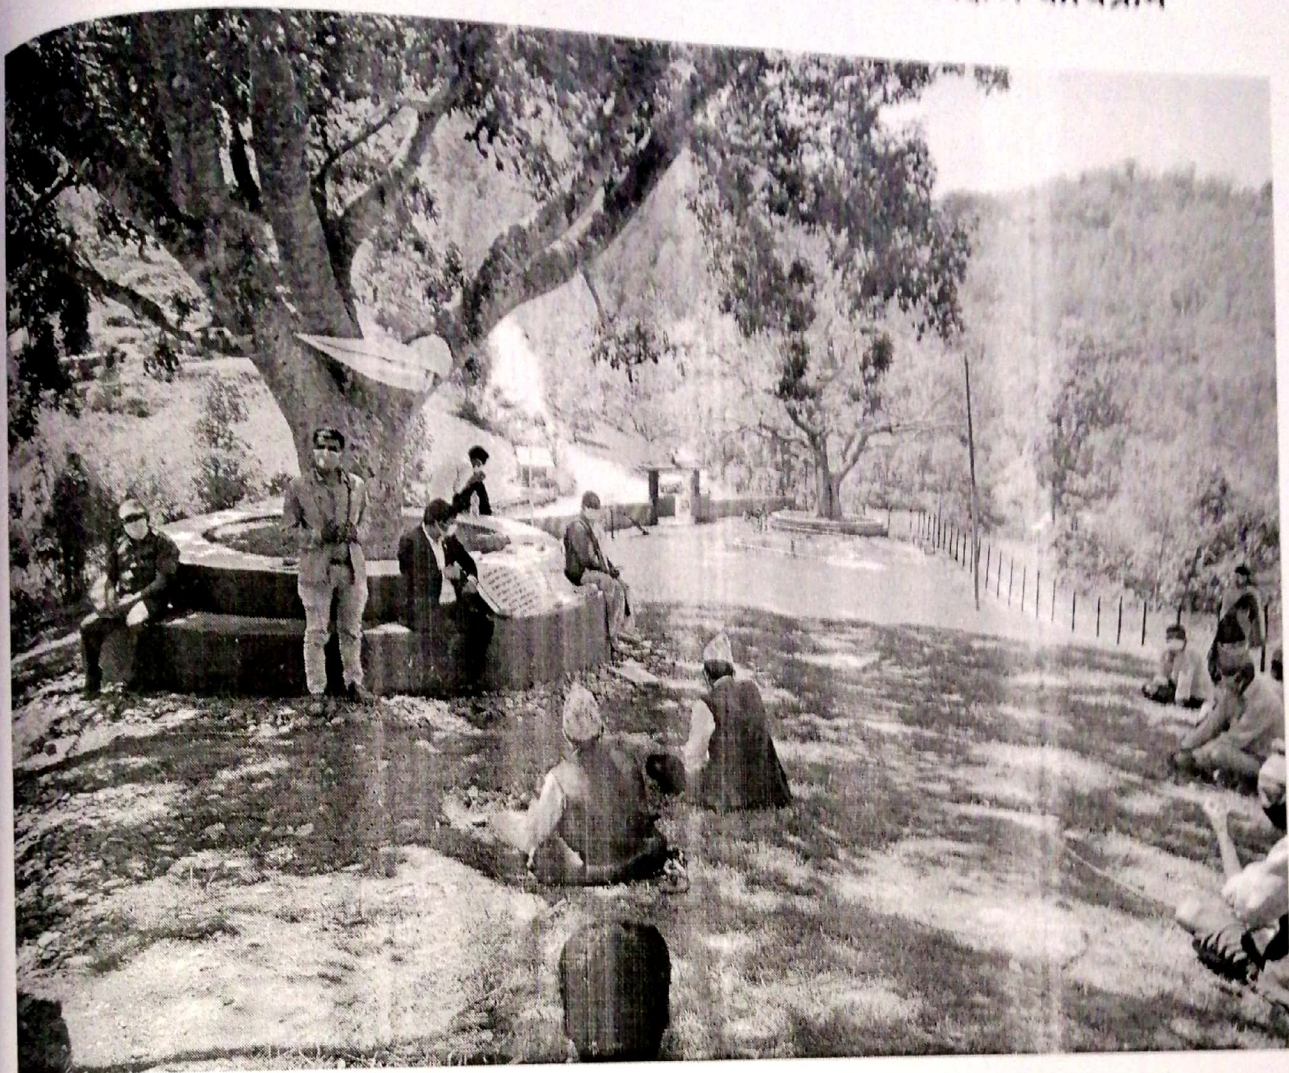
आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकाबाट	९,५,०००।००	विल	४९७७७०।९३
कन्टेन्नेन्स	- २८,५००।००	डोर हाजिरि फारम	२६८४००।-
उपभोक्ता श्रमदान	१०७७७०।९३	भरपाई	१६२४००।-
जम्मा	१०२८७७०।९३	अन्य	
		जम्मा	१०२८७७०।९३

ल. ल. ल.

म्यालनेटा वाल उद्यान, निर्माण योजना सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रम



म्यालनेटा वाल उद्यान, निर्माण योजना सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रम



आज मिति २०७७ साल बैशाख ३१ गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. ४ मा सञ्चालित रिठाका रुख मदन आश्रित स्मृति चौपारी निर्माण छत्रदेव ४ योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी र उपभोक्ताहरुको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो ।

बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
५,००,०००।००	स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	५,३८,८८९।१८	५३,८८९।१८	२०७७/११/१६	२०७८/०३/२५

तपशिल

रोहबर प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री अशोक कुमार श्रेष्ठ	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री सुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
५.	श्री पार्वता पाण्डे	सब-इन्जिनियर	Absent
६.	श्री हरि प्रसाद खनाल	खा.पा.स.टे	
७.	श्री भाष्कर आचार्य	वडा सचिव	
८.	श्री दिगम्बर पाण्डे	वडा सदस्य	
९.	श्री सीता शरापुली	कर्मी	
१०.	श्री बाबु राज श्रेष्ठ	ह.प्र.वा	

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१.	लेख वडापुर साँडे	डा.प.हा	
२.	श्री त्रिभुलाल खनाल	कुडासुन चौकी जमाजक	
३.	श्री पुष्पा वडापुर	वडापुर	
४.	श्री रामचन्द्र गौतम	लुम्बिनी	रामचन्द्र

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
५	श्री कमला लोढा	इन्फे - ४	
६	श्री माया लोढा	कोषाटपत	
७	श्री गज्जु लोढा	सिदाय	
८	श्री उमाबाई चणवली	"	
९	श्री रमेशचंद्र लोढा	इन्फे - ४	
१०	श्री वेद वेदरा लोढा	"	
११	श्री चुरा मनी पाण्डे	"	
१२	श्री हारामण पसाद लोढा	"	
१३	श्री कृष्ण परियार	"	
१४	श्री सुरेश परियार	"	
१५			
१६			
१७			
१८			
१९			
२०			
२१			
२२			
२३			
२४			
२५			
२६			
२७			
२८			
२९			
३०			

आवहक

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

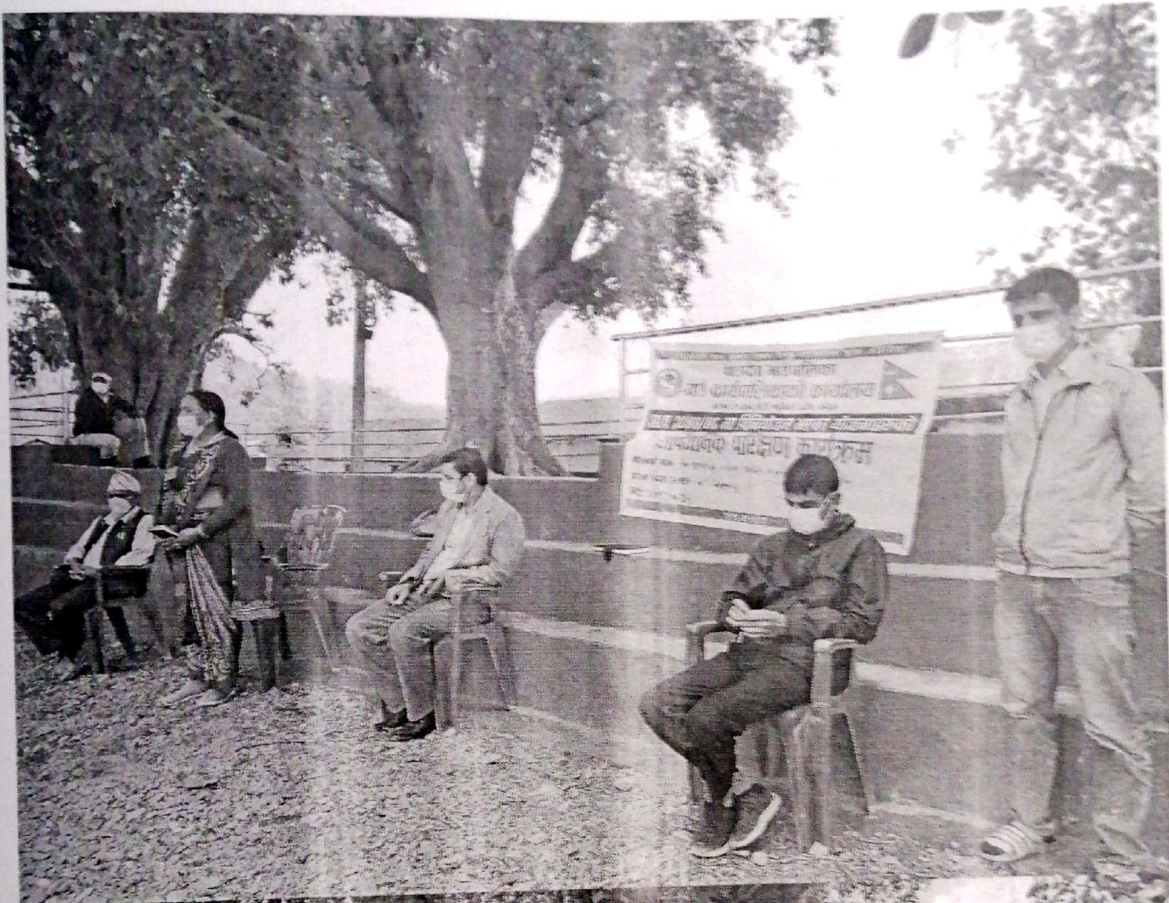
प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम द्वारा विनियोजित रकम वडा नं. ४ मा सञ्चालित रिठाका रुख मदन आश्रित स्मृति चौपारी निर्माण छत्रदेव ४ को प्राविधिक लागत ईष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निकास दिनका लागि छत्रदेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपशिल

आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकाबाट	५,००,०००।००	विल	२०८४४३।६
कलेजेन्सि	१५,०००।००	डोर हाजिरि फारम	९८८२००।००
प्रभोक्ता श्रमदान	२६४४३।६	भरपाई	९३४२००।००
जम्मा		अन्य	
		जम्मा	४४९४४३।६

६/११/१८

रिठाका रुख मदन आश्रित स्मृति चौपारी निर्माण छत्रदेव ४ सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रम



मिठाका राख मयन आश्रित स्मृति चौधारी निर्माण सुब्रह्म ५ सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रम



आज मिति २०७८ साल बैशाख २३ गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. १ मा सम्बालित ईदगाहा बाउण्डी र भस्जिद भिनारा निर्माण वडा नं. १ योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला विकासका प्रतिनिधी र उपभोक्ताहरुको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो।

बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्प्रीता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
१०,००,०००/००	प्रदेश सशर्त	१०,७७,८७८/४३	१,०७,८७८/४३	२०७७/०७/०५	२०७८/०९/३०

रोहबर प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री प्रकाश राज पन्थी	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री भरत मणि गिरी	वडा सदस्य	
५.	श्री जैनुल मियाँ	वडा सदस्य	
६.	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
७.	श्री सुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
८.	श्री किरण तामाङ	अ.सव-ईन्जिनियर	← Absent →
९.	श्री हरि प्रसाद खनाल	खा.पा.स.टे	
१०.	श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ	सहायक पाँचौ	
११.	नारायण ज्ञवाली	वडा स्तचिव	
१२.	ताए बहादुर वि. ३.	गापालिय सहायक	
१३.	वासुदेव गह्राई	ह.स.ली	

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधी

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
	अहिर मियाँ	छत्रदेव - १	
	शेखर जमिल मियाँ	छत्रदेव - १	
	रमलेर मियाँ	छत्रदेव - १	

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
	हरउदली मियाँ	छाजेव - १	छली मियाँ
	महसुरन मियाँ	छाजेव - १	महसुरन
	भोत्रि मियाँ	छाजेव - १	भोत्रि
	उमालादेव मियाँ	छाजेव - १	उमालादेव
	वसिरन मियाँ	छाजेव - १	वसिरन
०	वसिर मियाँ	छाजेव - १	वसिर मियाँ
१	मैपुत अलि	छाजेव - १	मैपुत
२	रमतली मियाँ	छाजेव - १	रमतली
३	अलिमहमत मियाँ	छाजेव - १	अलिमहमत
४	नजिर मियाँ	छाजेव - १	नजिर
५	आलिउ मियाँ	छाजेव - १	आलिउ मियाँ
६	अजिभर मियाँ	छाजेव - १	अजिभर मियाँ
७	अदाम मियाँ	छाजेव - १	अदाम
८	अलिभ मियाँ	छाजेव - १	अलिभ
९			
१०			
११			
१२			
१३			
१४			
१५			
१६			
१७			
१८			
१९			

प्रस्तावहरू

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को प्रदेश सभामै द्वारा विनियोजित रकम बढी नं.१ मा सञ्चालित ईदगाहा बाउण्ड्री र मस्जिद भिनास निर्माण बढी नं. १ को प्राविधिक लागत इष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निकास दिनका लागि छत्रवेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

तपशिल

आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकाबाट	१०,००,०००।००	विल	४७८६६०।=
कन्टेन्जेन्सि	३०,०००।००	डोर हाजिरि फारम	९०७५००।=
उपभोक्ता श्रमदान	११६३६६०।=	भरपाई	१५०००।=
जम्मा	१०६६३६६०।=	अन्य	
		जम्मा	१०६६३६६०।=

तस्मात्

ईदगाहा बाउण्ड्री र मस्जिद मिनारा निर्माण वडा नं. १ सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रम



आज मिति २०७८ साल असार १७ गते यस छत्रदेव गाउँपालिका वडा नं. १ मा सञ्चालित देवि मन्दिर निर्माण-देविडाँडा योजनाको सार्वजनिक परिक्षण यस गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं योजना अनुगमन समितिका संयोजक श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तपशिल बमोजिमका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र उपभोक्ताहरुको उपस्थितिमा भेला बसी सम्पन्न गरियो ।

बजेट	कार्यक्रम	लगत अनुमान	श्रमदान	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति
५,००,०००।००	वार्षिक विकास	५,३९,१९०।६४	५४,१९०।६४	२०७७/०९/०२	२०७८/०३/३०

रोहबर प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री तुल्सीदेवी श्रेष्ठ	संयोजक, छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष	
२.	श्री भेषराज पन्थ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
३.	श्री प्रकाश राज पन्थी	वडा अध्यक्ष	
४.	श्री भरतमणि गिरी	वडा सदस्य	
५.	श्री साजन पाण्डे	ईन्जिनियर	
६.	श्री सुनिल पन्थी	सूचना प्रविधि अधिकृत	
७.	श्री नारायण ज्ञवाली	वडा सचिव	
८.	श्री किरण तामाङ	अ.सव-ईन्जिनियर	
९.	श्री तारा वि.क	कार्यालय सहायक	
१०.	श्री राधा मुखिया	वी.वा. सहकर्म	
११.	श्री हरी प्र.पन्थी	सहायक पन्थी	Absent

उपभोक्ता तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधि

क्र.सं.	नाम थर	ठेगाना	हस्ताक्षर
१	कावेरी शर्मा	छत्रदेव १	
२	विष्णु गिरी	"	
३	लोकेन्द्रा पुरि		
४	सविता		
५	गंगा कुमल		
६	गिता न्यौपाने		
७	मनी राम पाण्डे		

क्र.सं.	नाम धर	वेगाना	हस्ताक्षर
८	धुव राज कुन्धी	दत्रदेव - १	धुव राज
९	वसिमत डरि	११	वसिमत
१०	मारा वडा डर		मारा वडा डर
११	कमल तलास मुमाल		कमल
१२	आमरहाडा		आमरहाडा
१३	रामा मुमाल		रामा
१४	जिबलाल चडवाड	११	जिबलाल
१५	वापुव वाना		वापुव
१६	रुमान जिरी		रुमान जिरी
१७	फुतेसिं लण्डा		फुतेसिं
१८	इचकी भाषा		इचकी
१९	बाभराज पाठे		बाभराज
२०	लक्ष्मण पुं लक्ष्मण		लक्ष्मण
२१	गोपाल दजी		गोपाल दजी
२२			
२३			
२४			
२५			
२६			
२७			
२८			
२९			
३०			
३१			
३२			
३३			

१. योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा।

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १ को सम्बन्धमा छलफल गर्दा आ.व. २०७७/७८ को गाउँसभा द्वारा विनियोजित रकम वडा नं. १ मा सञ्चालित देवि मन्दिर निर्माण-देविडाँडा को प्राविधिक लागत ईष्टिमेट अनुसारको कार्य नियमानुसार सम्पन्न भएको साथै उक्त योजनाको तपशिल अनुसारको आम्दानी खर्च देखिएकाले उक्त योजनामा विनियोजित बजेट निकासी दिनका लागि छत्रदेव गाउँपालिकामा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो।

तपशिल

आम्दानी	रकम रु. मा	खर्च	रकम रु. मा
गाउँपालिकावाट	५,००,०००।००	विल	२६९७८६।०१
कन्टेन्जेन्सि	१५,०००।००	डोर हाजिरि फारम	२३९२५०।-
उपभोक्ता श्रमदान	५७०३६।०५	भरपाई	४९०००।-
जम्मा	५४२०२६।०५	अन्य	
		जम्मा	५४२०२६।०५

आ.व २०७७/७८ संचालित योजनाहरुको सार्वजनिक परिक्षणका तस्विरहरु

